




DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	17/04/2018
DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA	15/08/2018
EMPREITEIRA RESPONSÁVEL	Seabra Construções
RESPONSÁVEL DA EMPREITEIRA	Francisco Seabra
CONTATO	(82) 999748571
PRAZO DE CONTRATO	16/04/2020
PRAZO DA OBRA	15/08/2018
ENGENHEIRO SESAU:	Guilherme Soares (82) 99351 1051
Nº DA MEDIÇÃO:	4 (QUARTA)

INFORMAÇÕES DA OBRA


Area de construção: 1.442,83. m<sup>2</sup>  
 Localização: Av. Juca Sampaio Jacintinho

Avanço Físico da Obra




■ Acumulado Total    ■ Acumulado Atual

Avanço Físico (Previsto x Realizado)

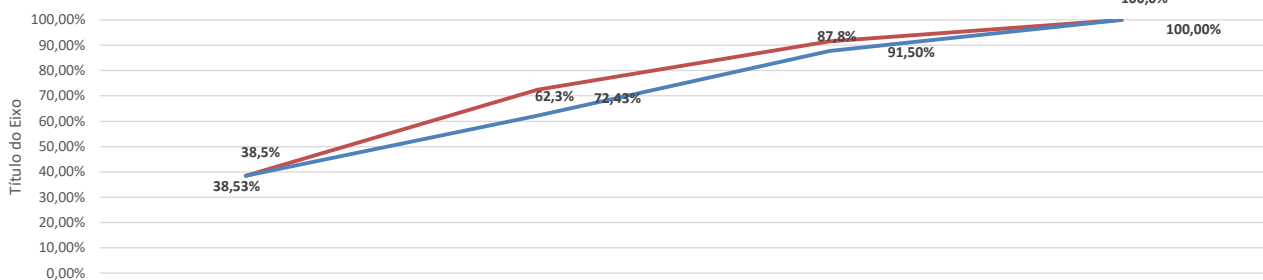

	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Avanço Físico Realizado	38,53%	72,43%	91,50%	100,00%
Avanço Físico Previsto	38,53%	62,27%	87,76%	100,00%

EXECUÇÃO FINANCEIRA (PREVISTO X REALIZADO)

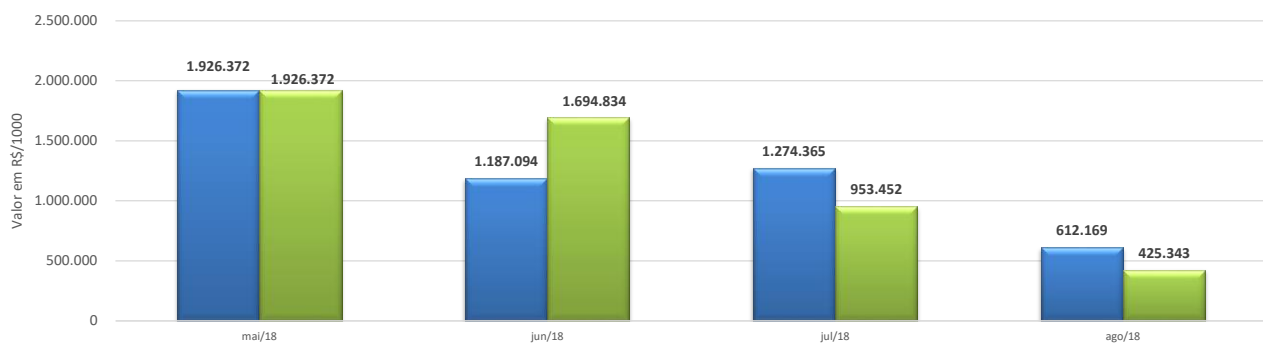

	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Valor Previsto	1.926.3	1.187.0	1.274.3	612.169
Série3	1.926.3	1.694.8	953.452	425.343

COMENTÁRIOS
