SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- SESAU
ASSESSORIA TECNICA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
RELATÓRIO DE OBRA - UPA TABULEIRO

DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO	07/06/2018
DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA	05/10/2018
EMPREITEIRA RESPONSAVEL	Seabra Construções
RESPONSAVEL DA EMPREITEIRA	Francisco Seabra
CONTATO	(82) 999748571
PRAZO DE CONTRATO	06/06/2020
PRAZO DA OBRA	05/10/2018
ENGENHEIRO SESAU:	Guilherme Soares (82) 99351 1051
Nº DA MEDIÇÃO:	4 (QUARTA)

INFORMAÇÕES DA OBRA

Area de construção: 1.442,83. m²
Localização: Av. Maceió, Tabuleiro do Martins

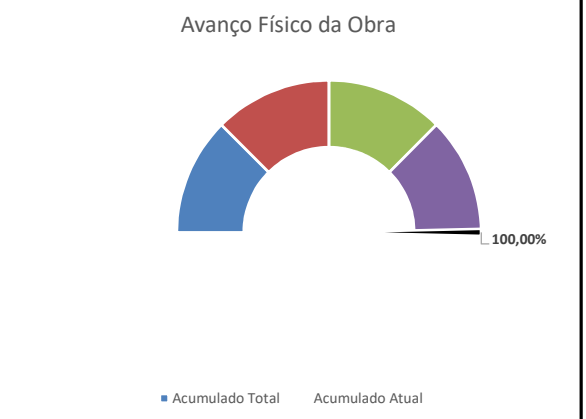

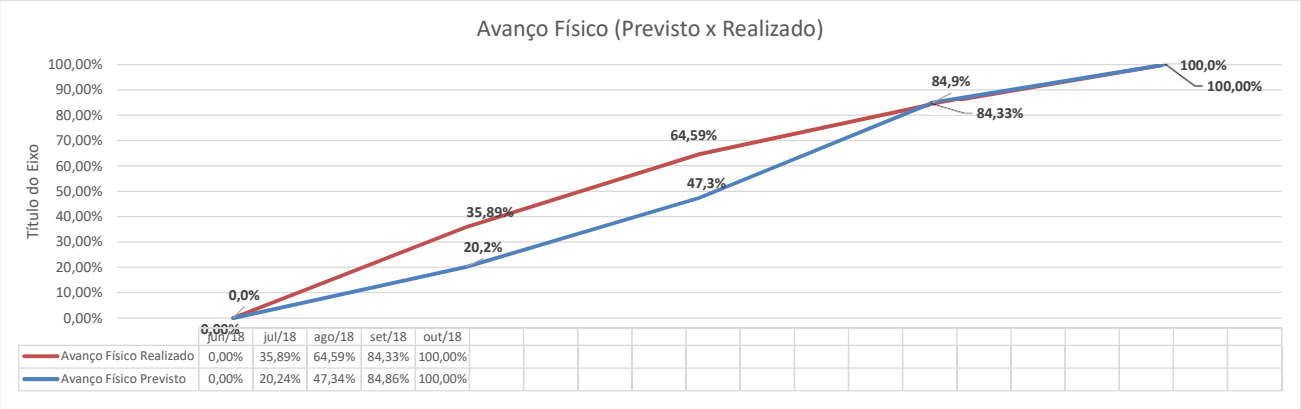

	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18
Avanço Físico Realizado	0,00%	35,89%	64,59%	84,33%	100,00%
Avanço Físico Previsto	0,00%	20,24%	47,34%	84,86%	100,00%

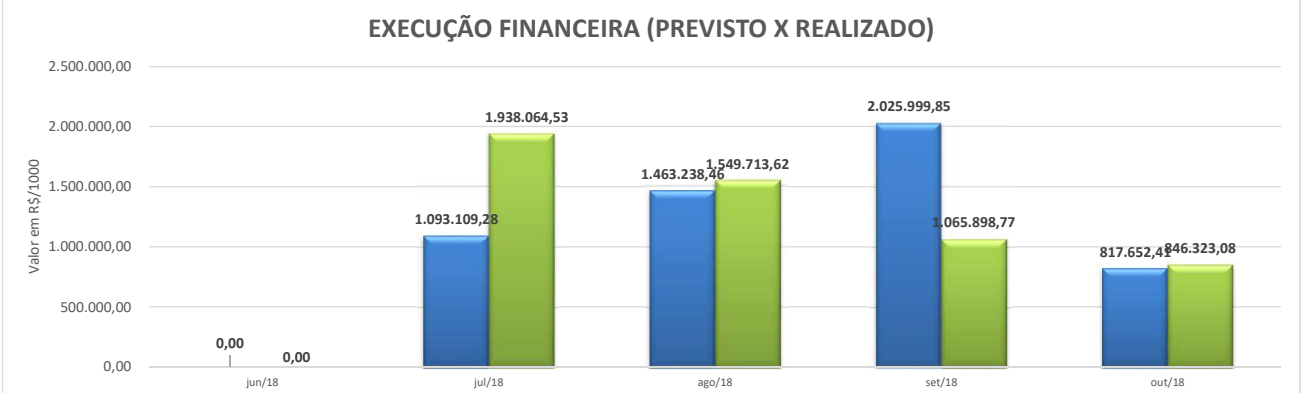

	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18
Valor Previsto	0,00	1.093.1	1.463.2	2.025.9	817.652
Série3	0,00	1.938.0	1.549.7	1.065.8	846.323

COMENTÁRIOS
